SforSales × rvvdev

REF. **SHN-2026 / 001** · 30 AVRIL 2026

PROPOSITION COMMERCIALE · PHASE SUIVANTE

Stabiliser, mesurer, faire grandir Shannen.

Plan de maintenance de la plateforme d'entraînement commercial, et lancement d'un Espace Coach pour piloter la progression des élèves depuis une seule interface.

POUR	DE	VALIDITÉ	FORMAT
Shannen	**rvvdev**	**30 jours**	**2 volets**
SforSales	— contact à compléter	jusqu'au 30/05/2026	Maintenance + Phase 2

SECTION 01 — ÉTAT DES LIEUX

Trois faits objectifs tirés du code en prod.

Pas d'analyse subjective : ces constats viennent de la base de données, de l'historique git et des métriques d'usage ElevenLabs. Ils orientent la totalité des recommandations qui suivent.

URGENT

500 000 crédits / 12 j

Compte ElevenLabs vidé en moins de deux semaines

Aucun rate-limiting, aucun quota par utilisateur. Un seul élève motivé peut consommer la totalité du forfait mensuel en quelques jours. Le coût d'usage croît linéairement avec les inscriptions, sans aucune visibilité ni alerte.

Plan mensuel **2 000 000 crédits** — atteint en **12 jours**.

RISQUE IMMINENT

×3 / 2 mois

Fixes successifs liés au modèle Claude

L'historique git montre trois correctifs consécutifs sur le nom ou la version du

BUG FONCTIONNEL

0% de fiabilité

Transcripts sauvegardés par chance

L'application stocke un identifiant erroné en base. L'API ElevenLabs renvoie

modèle. La prochaine dépréciation Anthropic interrompra l'application sans veille active.

systématiquement une erreur, seul un fallback côté navigateur sauve la donnée. Si l'onglet se ferme trop tôt, la simulation est perdue.

SECTION 02 — FORFAIT MENSUEL

Maintenance opérationnelle.

Trois piliers, des engagements chiffrés, aucun SLA bidon. Tout est livrable et vérifiable.

PILIER

A

Veille IA & dépendances

- **Surveillance hebdomadaire** de 4 sources : changelog Anthropic, blog ElevenLabs, releases GitHub Next.js, advisories Supabase.
- **SLA migration modèle** : nouveau modèle stable en prod sous `14 jours` après release ou avant la date de dépréciation, le premier des deux.
- **Trimestriel** : audit `npm audit` + montée Next / Supabase / Radix sur branche `mission1_neocell`, recette en preview Vercel avant `main`.

PILIER

B

Bug-fix garanti

- **SLA temps de réponse** : `< 24 h ouvrées` non-bloquant, `< 4 h ouvrées` critique.
- **Définition critique** : application inaccessible, perte de données, paiement bloqué.
- **Communication async** : email + canal partagé (Slack / Notion). Pas d'astreinte téléphonique.
- **1 release de patches / mois** minimum, déployée en preview avant prod.

PILIER

C

Optimisation crédits ElevenLabs

- **Plafonds par utilisateur** : ajout colonne `users.monthly_credit_limit` (défaut 50 000), vérification au démarrage de simulation, message UX dédié si dépassement.
- **Ajustements TTS** : `stability 0.5 → 0.3`, `similarity_boost 0.8 → 0.6`. Audit chiffré : −10 000 crédits / mois sans baisse de qualité perceptible.
- **Rapport mensuel** envoyé le 1er du mois : conso par user, top 5 consommateurs, projection 30 jours, alerte si > 80 % du quota.

ENGAGEMENT Si la consommation moyenne par utilisateur ne baisse pas d'au moins **X %** au bout de 6 mois, **un mois de maintenance offert**.

EXEMPLE — MIGRATION AJOUTÉE DÈS J+7 — SUPABASE/MIGRATIONS/LIMIT_CREDITS.SQL

```sql
ALTER TABLE users ADD COLUMN monthly_credit_limit integer DEFAULT 50000; -- Hook au démarrage de simulation SELECT SUM(duration_seconds) FROM conversations WHERE user_id = $1 AND created_at ≥ date_trunc('month', NOW()); -- → bloquer si total > monthly_credit_limit
```

HORS-PÉRIMÈTRE — EXPLICITEMENT EXCLU DU FORFAIT

Nouvelles fonctionnalités
Traitées en avenant ou bank d'heures.

Support utilisateur final
Pris en charge par l'équipe Shannen.

Astreinte 24/7
L'application n'est pas une infrastructure critique.

SECTION 03 — PHASE 2

L'Espace Coach, vu de l'intérieur.

Aperçu du tableau de bord livré en deux à trois semaines. Toutes les données affichées ici existent *déjà* en base — il s'agit d'un module de lecture sur les tables `feedback` et `conversations`, pas d'une refonte.

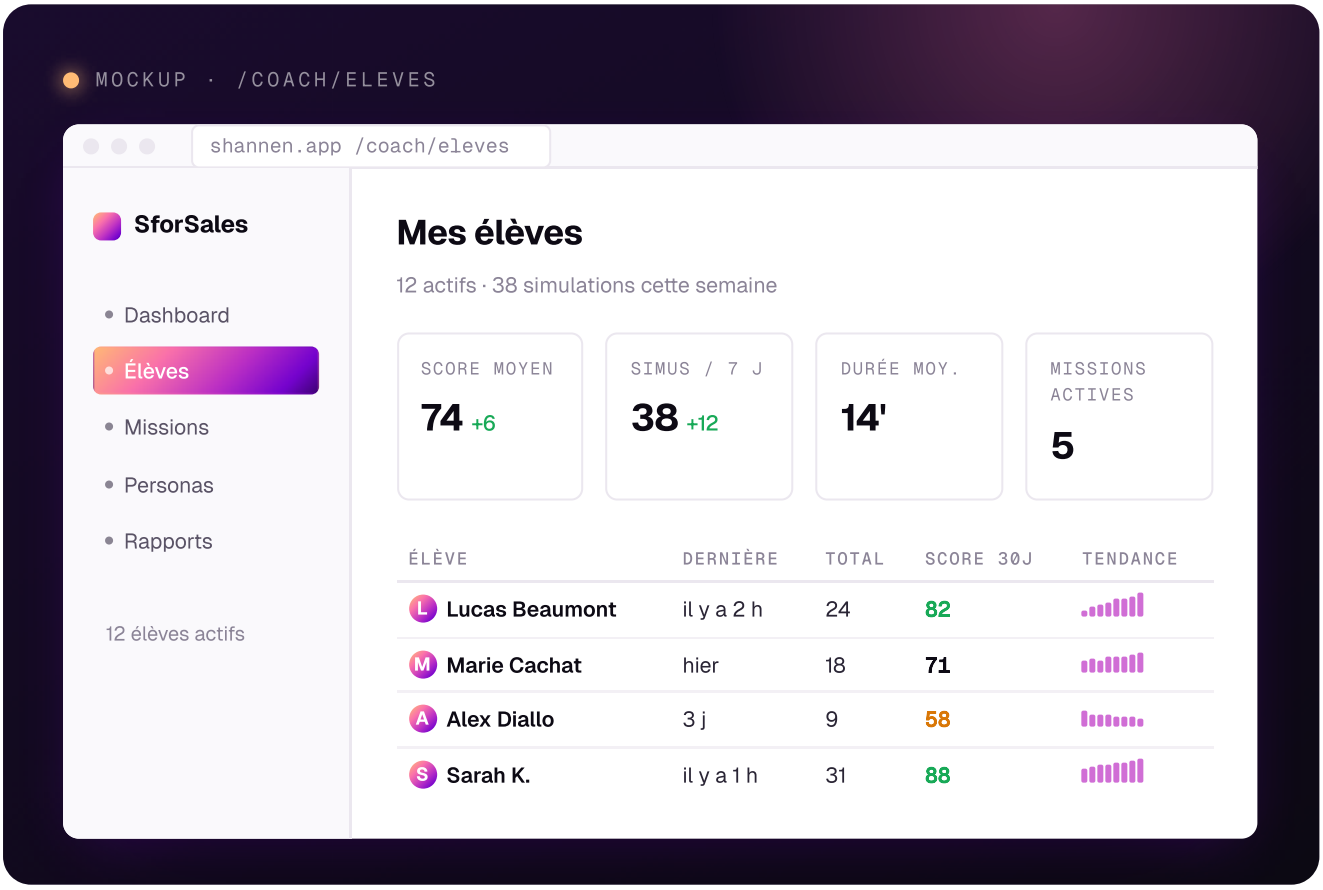

01 — Vue élève

Tout l'historique en un seul écran

Timeline des simulations avec accès direct au transcript et au feedback IA. Heatmap des points forts et axes d'amélioration récurrents (calculée sur les arrays existants).

02 — Notes privées

Annotations de coaching par élève

Éditeur Markdown, historique horodaté, recherche full-text. Visible uniquement par le coach. Une seule nouvelle table, RLS isolée.

Table `coach_notes` · `coach_id`, `student_id`, `content`, `created_at`

Route `/coach/eleves/[id]` · agrégat sur 30/90 jours

03 — Missions

Prescription d'exercices simples

Le coach assigne « 3 cold calls avec Pierre Moreau d'ici dimanche ». Statut auto Pending / In progress / Done. Notification email à la complétion.

Table `missions` · statut calculé par requête

04 — Cohorte

Filtres & comparaisons

Filtres par période, type d'appel, persona. Identification automatique des élèves qui décrochent (3 simus en moins sur 14 j vs moyenne).

Cron quotidien · alerte coach par email

SECTION 04 — DÉCISION

Synthèse & prochaines étapes.

Les deux volets sont indépendants mais conçus pour fonctionner ensemble. Les montants sont à finaliser après le cadrage commercial.

VOLET	PÉRIMÈTRE	MONTANT
Maintenance FORFAIT MENSUEL · 12 MOIS	Veille IA & dépendances avec SLA migration sous 14 jours. Bug-fix garanti 24 h / 4 h. Optimisation crédits ElevenLabs avec engagement chiffré et rapport mensuel.	__ € HT / MOIS
Espace Coach FORFAIT FIXE · 2-3 SEMAINES	Tableau de bord coach + vue élève détaillée + notes privées + missions + filtres cohorte. Migration DB minimaliste (1 colonne, 2 tables). Recette en preview avant prod.	__ € HT — FIXE

01 **Validation du périmètre**

Cadrage final : engagement chiffré sur les crédits ElevenLabs (X%), arbitrage des exclusions, calage du planning Phase 2.

02 **Signature**

Contrat de maintenance à effet immédiat. Bon de commande Phase 2 émis en parallèle pour planifier la livraison de l'Espace Coach.

03 **Démarrage Phase 2**

Sprint sur branche dédiée, recette en preview Vercel sur `mission1_neocell`, mise en production progressive sans interruption pour les utilisateurs existants.

ÉMETTEUR

rvvdev

contact & coordonnées — éditable

VALIDITÉ DE L'OFFRE

30 jours — jusqu'au 30 mai 2026

RÉFÉRENCE

SHN-2026 / 001
